




COMUNE DI SARDARA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'
LOCALE**

- INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.

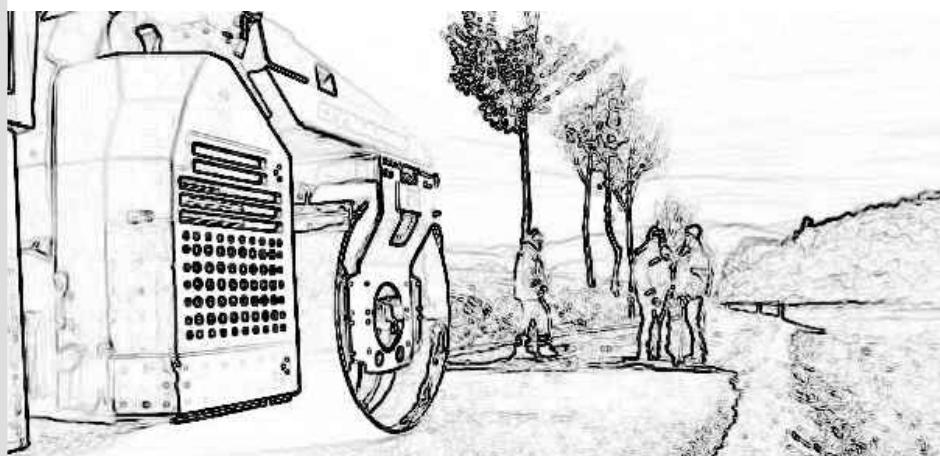

COMMITTENTE:
COMUNE DI SARDARA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
P.ZZA GRAMSCI. 1
09030 SARDARA

- CRONOPROGRAMMA

ALL 8

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. MARIO PITTALUGA

IL TECNICO

ING. CARLO ORRU'

Compilazione: **03/11/2018**Progettista **Ing. Carlo Orrù**Calendario **02/01/2019**

Primo giorno della settimana (Lun=2): 4

Attività	Inizio	Fine	Durata (Giorni)	% Compl.	Gg. Di lavoro	Giorni completi	Giorni Rimanent																		
								02 - gen - 19	09 - gen - 19	16 - gen - 19	23 - gen - 19	30 - gen - 19	06 - feb - 19	13 - feb - 19	20 - feb - 19	27 - feb - 19	06 - mar - 19	13 - mar - 19	20 - mar - 19	27 - mar - 19	03 - apr - 19	10 - apr - 19	17 - apr - 19	24 - apr - 19	01 - mag - 19
1 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	02/01/2019	02/03/2019	60	100%	43	60	0																		
1.1 Allestimento cantiere	02/01/2019	16/01/2019	15	100%	11	15	0																		
1.2 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	02/01/2019	02/03/2019	60	100%	2	60	0																		
1.3 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	17/01/2019	02/03/2019	45	100%	2	45	0																		
1.4 Smobilizzo del cantiere	02/03/2019	02/03/2019	1	100%	0	1	0																		
1 Demolizioni	02/01/2019	21/01/2019	20	100%	14	20	0																		
1.1 Scarifica	02/01/2019	21/01/2019	20	100%	14	20	0																		
3 Bitumatura	22/01/2019	20/02/2019	30	100%	22	30	0																		
3.1 Realizzazione Bitumatura	22/01/2019	20/02/2019	30	100%	22	30	0																		
3.2 Messa in quota chiusini	22/01/2019	20/02/2019	30	100%	22	30	0																		
5 Segnaletica	21/02/2019	02/03/2019	10	100%	7	10	0																		
5.1 Realizzazione segnaletica Orizzontale	21/02/2019	02/03/2019	10	100%	7	10	0																		
TOTALE	02/01/2019	02/03/2019	60																						

C)Diagramma di Gantt, completato per gli aspetti economici (espresso in migliaia di Euro)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' LOCALE					
PERIODI	LAVORI	1° MESE	2° MESE	TOT. LAV.NI	%
OG3		€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 150.000,00	100,00%
TOT.MESE		€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 150.000,00	
PARZIALE		50,00%	50,0%		100%
PROGRES.		50,00%	50,00%		
